


ID	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Kv 2, 2024				Kv 3, 2024			Kv 4, 2024			Kv 1, 2
					mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	jan
1															
2	OPPSTART	24 dager	ma 08.04.24	to 09.05.24											
3	Rigg	1 dag	ma 08.04.24	ma 08.04.24											
4	Riving på parkering	15 dager	ma 08.04.24	fr 26.04.24											
5	Riving i trapping	16 dager	ma 15.04.24	ma 06.05.24											
6	Riving ved fjellkoller	10 dager	fr 26.04.24	to 09.05.24											
7	Parkering/merking 91 plasser	2 dager	on 24.04.24	to 25.04.24											
8															
9	Område trapping. 3+8+8+8+7	124 dager	ti 30.04.24	fr 18.10.24											
10	Rensing og sprenging	13 dager	ti 30.04.24	to 16.05.24											
11	Fordrøyningsmagasin	5 dager	fr 17.05.24	to 23.05.24											
12	OV Grøfter	10 dager	fr 24.05.24	to 06.06.24											
13	Grunnarbeider garasjer	20 dager	fr 07.06.24	to 04.07.24											
14	Betongarbeider	11 dager	fr 28.06.24	fr 12.07.24											
15	<u>Ferie</u>	15 dager	ma 15.07.24	fr 02.08.24											
16	Betongarbeider	20 dager	ma 05.08.24	fr 30.08.24											
17	Garasjer/elektro	35 dager	ma 02.09.24	fr 18.10.24											
18															
19	Område sør 9+9+13	80 dager	on 03.07.24	ti 22.10.24											
20	Rensing og sprenging	10 dager	on 03.07.24	ti 16.07.24											
21	<u>Ferie</u>	15 dager	ma 15.07.24	fr 02.08.24											
22	OV Grøfter	6 dager	ma 05.08.24	ma 12.08.24											
23	Grunnarbeider garasjer	10 dager	ti 13.08.24	ma 26.08.24											
24	Betongarbeider	10 dager	ti 27.08.24	ma 09.09.24											
25	Garasjer/elektro	31 dager	ti 10.09.24	ti 22.10.24											
26															
27	Område fjellkolle 11+19+22+28+29+13+3	162 dager	on 01.05.24	to 12.12.24											
28	Rensing, sprenging og knusing	35 dager	on 01.05.24	ti 18.06.24											
29	OV Grøfter	18 dager	on 19.06.24	fr 12.07.24											
30	<u>Ferie</u>	15 dager	ma 15.07.24	fr 02.08.24											
31	Grunnarbeider garasjer	25 dager	ma 05.08.24	fr 06.09.24											
32	Betongarbeider	20 dager	fr 30.08.24	to 26.09.24											
33	Garasjer/elektro	55 dager	fr 27.09.24	to 12.12.24											
34															
35															
36	Parkeringsplass / utomhus	44 dager	ma 30.09.24	to 28.11.24											
37	Grøfter og kummer	12 dager	ma 30.09.24	ti 15.10.24											
38	Bygging av parkeringsplass og fortau	12 dager	on 16.10.24	to 31.10.24											
39	Diverse utomhus og kabelgrøfter	20 dager	fr 01.11.24	to 28.11.24											

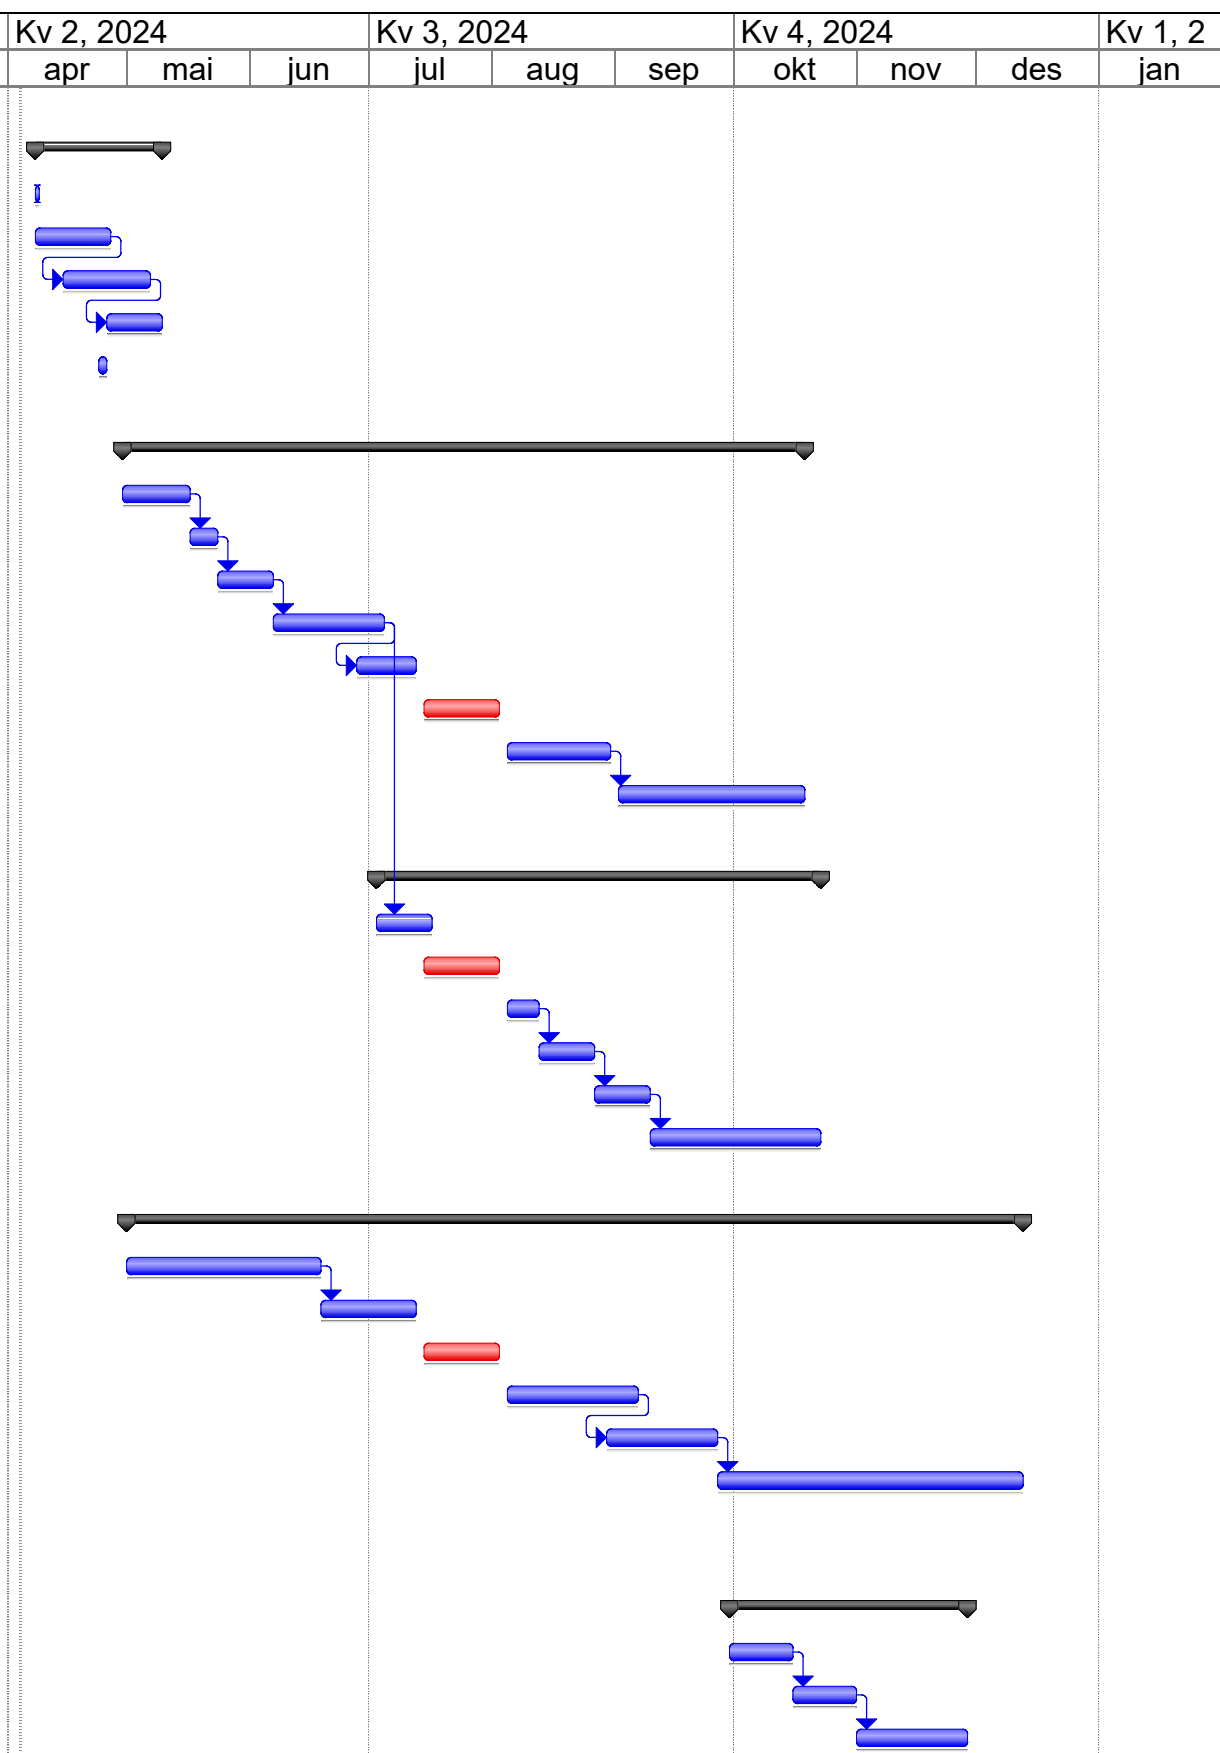

Prosjekt: Fremdriftsplan utkast
Dato: to 04.04.24

Aktivitet		Fremdrift		Sammendrag		Eksterne aktiviteter		Tidsfrist	
Deling		Milepæl		Prosjektsammendrag		Ekstern milepæl			
